

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2017)	ACTA No.	TUX-FISM-046-2017
-------	--	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2017 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. CARLOS GUTIÉRREZ PALACIOS, ING. ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, E ING. JULIO CESAR RAMOS BALBOA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA; PROVEEDORA COMERCIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. C. IGNACIO ALBERTO ACUÑA TRUJILLO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA, PROVEEDORA COMERCIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. C. IGNACIO ALBERTO ACUÑA TRUJILLO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO

LOCALIDAD: EN LA AGEB 2232, 1982,2336, 2514, 2321, 2181 EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2017 LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2017 VERIFICO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

PROVEEDORA COMERCIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V.

TELEFONO:

019616139714
0449611661216

DOMICILIO FISCAL:

CALLE 8a. PONIENTE SUR No. 455 A. COL. CENTRO EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RCM:

No. DE CONTRATO: TUX-FISM-046-2017

FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2017

PLAZO:

60 DIAS NATURALES

FECHA INICIO

25 DE AGOSTO DE 2017

FECHA

TERMINACION

23 DE OCTUBRE DE 2017

MONTO (CON IVA)

\$1.787.032.26

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)

\$893,516.13

FECHA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2017)	ACTA No.	TUX-FISM-046-2017
-------	--	----------	-------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	25 DE AGOSTO DE 2017	
TERMINACIÓN	23 DE OCTUBRE DE 2017		

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS
NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

25 DE AGOSTO DE 2017

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 23 DE OCTUBRE DE 2017.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2121412	\$893,516.13	23-ago-17	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.
CUMPLIMIENTO	2121418	\$178,703.23	23-ago-17	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

SANCCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2017)	ACTA No.	TUX-FISM-046-2017
-------	--	----------	-------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS


DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

SE CONSTRUIRÁN 27 CUARTOS DORMITORIOS, QUE CONSISTE EN LA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN DE UNA RECAMARA DE 14.40 M2 CIMENTACIÓN ZAPATA CORRIDA DE 55 CM DE ANCHO POR 13 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA 3/8" @ 12CM a.s. CONTRATRABE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 20*30 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y UNA ADICIONAL EN LECHO SUPERIOR DE 3/8" Y ESTRIBOS CON VARILLA No. 2 A CADA 15 CM T A CADA 10 CM EN LOS EXTREMOS, ESTRUCTURAS DE CONCRETO CASTILLO Y CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION DE 12*15 CM DE CONCRETO F'C) 150 KG/CM2 ARMADA CON ELEMENTO PRESOLADO DE 11*11 4/8 ML. BLOCK HUECO DE 15*20*40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP> 1:5 ACABADO COMUN ACABADO> APLANADO DE MURO EN FACHADAS FRONTAL CON ESPONJADO Y FACHADA POSTERIOR CON ACABADO ESPONJEADO A UNA ALTURA DE 75 CM DE LECHO SUPERIOR DE LA LOSA HACIA ABAJO, CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6 PISO FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, CUBIERTA: LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/64-4 T BASTONES @ 25 CM EN EL SENTIDO CORTO Y @ 20 CM EN EL SENTIDO LARGO CON VARILLA DE 3/8" Y CONCRETO F'C=200 KG CM2 CON IMPPEARIBILIZANTE ACRILICO EN COLOR BLANCO PUERTA Y VENTANA; 1 PUERTA, 1 VENTANA DE HERRERIA ECONOMICA INSTALACION ELECTRICA: 1 SALIDA

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

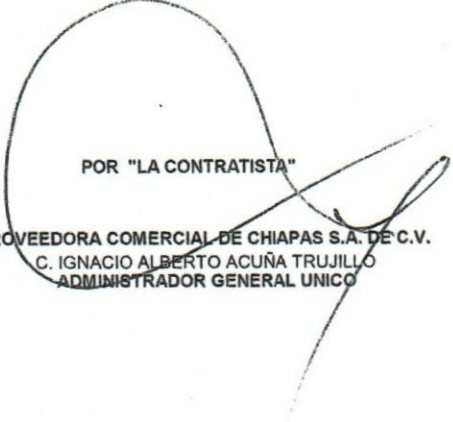
POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. CARLOS GUTIERREZ PALACIOS
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION


ING. JULIO CESAR RAMOS BALBOA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"


PROVEEDORA COMERCIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V.
C. IGNACIO ALBERTO ACUÑA TRUJILLO
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
