



PDR-005/17

000010

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR 2017)	ACTA No.	TUX-PDR-007-2017
-------	---	----------	------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 11 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS LOS CC. ING. CARLOS GUTIÉRREZ PALACIOS, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. ÓSCAR VILLASÍS COUTIÑO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA INGENIERÍA FRONTERA SUR S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ING. JORGE AGUIRRE TREJO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 64 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA, LA EMPRESA INGENIERÍA FRONTERA SUR S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ING. JORGE AGUIRRE TREJO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
 OBRA Y/O PROYECTO:

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO

LOCALIDAD:	DEL ANDADOR CERRO DE LA SEPULTURA ENTRE AVENIDA TACANÁ Y CIRCUITO JOYYO MAYU PONENTE EN LA COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
------------	---	------------	----------------------------

CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO SIN, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CON FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS VERIFICÓ CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE PROCEDE CON BASE A LOS ARTÍCULOS 64, PÁRRAFO PRIMERO DE LA CITADA LEY, A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	INGENIERÍA FRONTERA SUR S.A. DE C.V.	TELÉFONO:	(01 981) 255 60 61
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA 3A. SUR ORIENTE NO. 1118 COL. AMPLIACION TERAN		
No. DE REGISTRO DEL R.F.C.:	IFS150325K04		
No. DE CONTRATO:	TUX-PDR-007-2017	FECHA:	05 DE JULIO DE 2017
		PLAZO:	45 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	10 DE JULIO DE 2017
		FECHA TERMINACION	23 DE AGOSTO DE 2017
	MONTO (CON IVA)		\$629,548.37
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA	\$188,884.51 21 DE JULIO DE 2017





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

000011

FONDO	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR 2017)	ACTA No.	TUX-PDR-007-2017
-------	---	----------	------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	21 DE JULIO DE 2017	21 DE JULIO DE 2017
TERMINACIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DE 2017	03 DE SEPTIEMBRE DE 2017	

DIFERIMIENTO POR ANTICIPO
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

OFICIO No. SOP/D/DC/0832-A/2017 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2017

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

21 DE JULIO DE 2017

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 21 DE JULIO DE 2017 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-06371-3	\$188,864.51	05-jul-17	INSURGENTES
CUMPLIMIENTO	8161-06373-5	\$62,954.84	05-jul-17	INSURGENTES
VICIOS OCULTOS	8161-08940-9	\$62,954.84	11-sep-17	INSURGENTES

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)





000012

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR 2017)	ACTA No.	TUX-PDR-007-2017
-------	---	----------	------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS **DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**
 661.92 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO MR=45 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR; 239.53 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 SECCIÓN 15X20X40 CM; 186.02 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; REHABILITACIÓN DE 12.00 DESCARGAS DOMICILIARIAS; REHABILITACIÓN DE 12.00 TOMAS DOMICILIARIAS; Y CONSTRUCCIÓN DE 12.00 REGISTROS SANITARIOS.

OBRA

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO - NORMAL)	21-jul-17	15-ago-17	15-ago-17	\$ 259,049.65	\$ 41,447.94	\$ 300,497.59	\$90,149.28
02-EXT (DOS - EXTRAORDINARIA)	21-jul-17	15-ago-17	15-ago-17	\$ 57,580.67	\$ 9,212.91	\$ 66,793.58	\$20,038.07
03-N (TRES - NORMAL)	16-ago-17	31-ago-17	31-ago-17	\$ 144,973.36	\$ 23,195.74	\$ 168,169.10	\$50,450.73
04-F (CUATRO - FINIQUITO)	01-sep-17	03-sep-17	03-sep-17	\$ 81,110.43	\$ 12,977.67	\$ 94,088.10	\$28,226.43
TOTALES : \$				\$ 542,714.11	\$ 86,834.26	\$ 629,548.37	\$ 188,864.51

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/10 M.N.)

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



000013

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR 2017)	ACTA No.	TUX-PDR-007-2017
-------	---	----------	------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 64 Y 66 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR EL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ


DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


C. ING. CARLOS GUTIÉRREZ PALACIOS

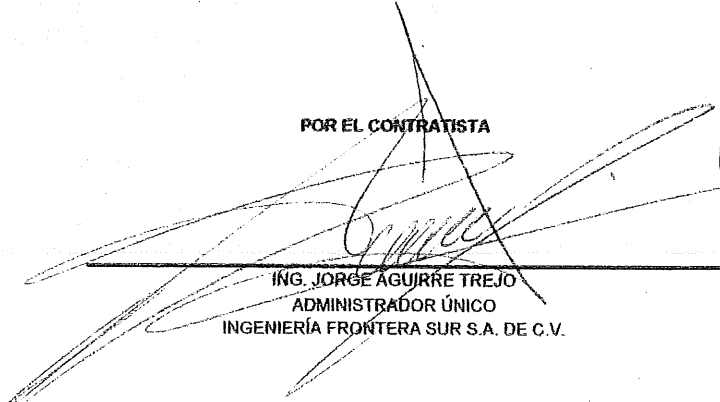
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


C. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ

RESIDENTE DE OBRA


C. ING. OSCAR VILLASIS COUTIÑO

POR EL CONTRATISTA


ING. JORGE AGUIRRE TREJO
ADMINISTRADOR ÚNICO
INGENIERÍA FRONTERA SUR S.A. DE C.V.

