



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-170-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-138/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-138		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 11 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTÍNEZ E ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. HORACIO MARTÍNEZ GÓMEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y "LA EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. HORACIO MARTÍNEZ GÓMEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN DE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 11 DE JULIO DE 2024, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 11 DE JULIO DE 2024 VERIFICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9616718305
DOMICILIO FISCAL:	CALLE POMONA No. 333, MZ 2 LT 9, COLONIA EL CAMPANARIO, C.P. 29038 EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CPC1003043E0		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-170-2024	DE FECHA:	07 DE JUNIO DE 2024
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	12 DE JUNIO DE 2024
		FECHA TERMINACIÓN	10 DE AGOSTO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$537,482.32
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$268,741.16
		FECHA	02 DE JULIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-170-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-138/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-138		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

FECHA:

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

NO APLICA

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	12 DE JUNIO DE 2024	12 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	11 DE JULIO DE 2024	10 DE AGOSTO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

12 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 11 DE JULIO DE 2024

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	24A31158	\$268,741.16	07-jun-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	24A31160	\$53,748.23	07-jun-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	24A44175	\$53,748.23	11-jul-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-170-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-138/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-138		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

132.27 M2 DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO, 30.00 M DE CORTE HASTA 5 CMS DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO, 1.08 M3 DE RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO, 83.70 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, REHABILITACIÓN DE 2 POZOS DE VISITA EXISTENTE DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD, 2 POZOS DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, 2 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CERRADO CON TAPA PARA POZO DE VISITA, 7 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 60 CMS DE RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN ESCALÓN PARA POZO DE VISITA, 24 REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 24 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, ATAGUÍAS, BOMBEO DE ACHIQUE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APIZONADA, RELLENO APIZONADO Y COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	12 DE JUNIO DE 2024	11 DE JULIO DE 2024	11 DE JULIO DE 2024	\$463,346.83	\$74,135.49	\$537,482.32	\$268,741.16
TOTALES : \$				\$463,346.83	\$74,135.49	\$537,482.32	\$268,741.16

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA


FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-170-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-138/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-138		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

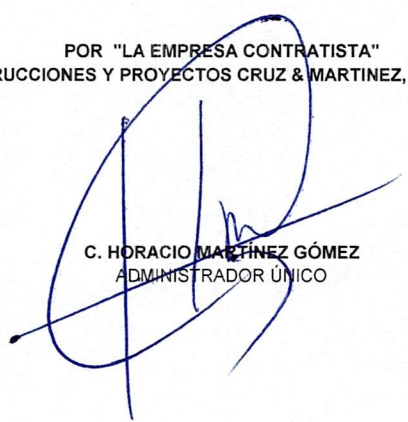
POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V.


C. HORACIO MARTÍNEZ GÓMEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO


CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V.
R.F.C. CPC1003043E0
AV. CARDENAL No. 1231, FRACC. BUENOS AIRES
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; C.P. 29050
TELÉFONO: 961 671 8305
