

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-005-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-010/19 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-11 05-03-010		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 14 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAÚL GONZÁLEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ E ING. GUILLERMO ANTONIO ZEBADUA ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V. , REPRESENTADA POR LA C. GUILERMO DE JESÚS SOLÍS LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. GUILERMO DE JESÚS SOLÍS LÓPEZ , EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ; UBICADA EN LA 3a ORIENTE SUR PEGADA A L BARDA DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA FUERZA AEREA ENTRE 5a AVENIDA SUR OTE Y PRIADA DE LA 2a AV, SUR OTE

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ COLONIA : SAN JOSE TERAN MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2019 LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2019 , LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V.		TELÉFONO Y FAX:	(01 986) 632157
DOMICILIO FISCAL:	7a. AVENIDA PONIENTE SUR NO. 110 BARRIO DE LA CANDELARIA, EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS			
No. DE REGISTRO DEL RFC:	RFC:091021456			
No. TUX-SOP-FISM-005-2019	DE FECHA:	04-jun-19	PLAZO:	90 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	05-jun-19	FECHA TERMINACION	02-sep-19
	MONTO (CON IVA)	\$3,123,180.87		
	MONTO ANTICIPO (CON IVA)	\$936,954.28	FECHA	21-jun-19



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-005-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-010/19 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-11 05-03-010		

AMPLIACIONES: NO APLICA

MONTO: NO APLICA

No. DE CONVENIO: NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA): NO APLICA MONTO TOTAL (CON IVA) NO APLICA FECHA: NO APLICA

PLAZO: NO APLICA

FECHAS	REAL	SEGUN ANTICIPO
INICIO	12 de agosto de 2019	21 de junio de 2019
TERMINACION	09/11/2019	18 DE SEPTIEMBRE 2019

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO: NO APLICA

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. NO APLICA

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NATURALES INICIO NO APLICA TERMINACION NO APLICA PLAZO TOTAL NO APLICA

AJUSTE DE COSTOS: NO APLICA

MONTO (CON IVA) NO APLICA FECHA NO APLICA

AVISO DE INICIO DE OBRA: 12 de agosto de 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2019 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 09 DE NOVIEMBRE 2019.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFANZADORA
ANTICIPO	1999952	\$806,664.26	04-jun-19	Club Fianza Monterrey
CUMPLIMIENTO	1999951	\$312,318.09	04-jun-19	Club Fianza Monterrey
VICIOS OCULTOS	2048801	\$312,318.09	14-16v-19	Club Fianza Monterrey

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE) NO APLICA

Cx

[Handwritten signatures and scribbles]



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FCNDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-005-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN		SP/DIPM/FISM-010/19 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2019 Y CON CLAVÉ PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-11-05-03-010	

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 633.74 METROS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200MM. (10") DE DIAMETRO SERIE 16.5; REHABILITACION DE 5.00 DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE INCLUYE 1 G.MTS. DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 8" DE DIAMETRO SILLETA DE 3"-8", CODO DE 45G. DE 6". INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RELLENO, PLANTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	

No.	PERÍODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-NA (UNO NORMAL ADICIONAL)	12 de agosto de 2019	31 de agosto de 2019	31 AGO-2019	\$ 615,210.00	\$ 99,433.76	\$ 713,644.76	\$ 214,093.43
02-NA (DOS NORMAL ADICIONAL)	1 de septiembre de 2019	30 de septiembre de 2019	30 sep-19	\$ 427,003.01	\$ 68,320.68	\$ 495,324.56	\$ 148,597.36
03-EXT (TRES EXTRAORDINARIA)	1 de octubre de 2019	31 de octubre de 2019	31 oct-19	\$ 109,519.70	\$ 27,123.15	\$ 136,642.85	\$ 58,992.85
04-NA-E-FINQUITO (CUATRO-NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARIA-FINQUITO)	1 de noviembre de 2019	9 de noviembre de 2019	09-nov-19	\$1,454,851.81	\$ 232,789.09	\$ 1,687,720.90	\$ 515,270.81
TOTALES : \$				2,606,686.41	\$ 428,666.63	\$ 3,099,333.04	\$ 936,954.26

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERÍODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
N/A							
N/A							
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$29,847.83 (VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

Cx

[Handwritten signature]



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-005-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-010/19 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-11-05-03-010		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

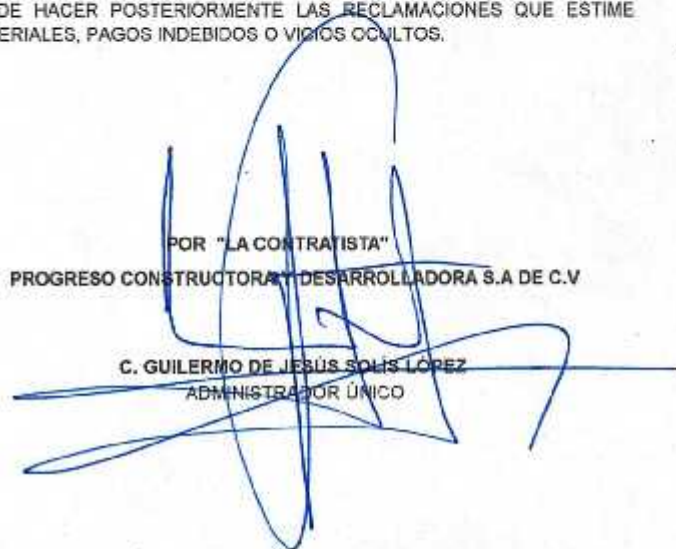

ING. RAÚL GONZÁLEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A DE C.V


C. GUILLERMO DE JESÚS SOLÍS LÓPEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
