



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-029-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-045/20 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2020 Y No. OBRA 2.2.3.-101-AS-09-05-045		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 12 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ Y EL ARQ. JOSÉ EMILIO SANCHEZ MORALES ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. LAURELLA ALEJANDRA MARTINEZ MORALES, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. LAURELLA ALEJANDRA MARTINEZ MORALES, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE , EN LAS CALLES RÍO ZANATENCO Y RÍO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL Y AVENIDA RÍO SABINAL ENTRE CALLE RIO ZANATENCO Y CALLE SANTO DOMINGO, COLONIA LOMA BONITA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

COLONIA : LOMA BONITA

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V.	TELEFONO Y FAX:	9611771086, 9611414253, 9651036279
DOMICILIO FISCAL:	CARRETERA TUXTLA-CHICOASEN No. 769-A, COL. PLAN DE AYALA, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CMM100312JZ9		
No. TUX-SOP-FISM-029-2020	DE FECHA:	06 DE AGOSTO DE 2020	PLAZO:
			75 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	13 DE AGOSTO DE 2020	FECHA TERMINACION
			26 DE OCTUBRE DE 2020
	MONTO (CON IVA)	\$375,888.28	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$187,944.14	FECHA
			13 DE AGOSTO DE 2020

[Handwritten signature and initials]



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-029-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN		SP/DIPM/FISM-045/20 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2020 Y No. OBRA 2.2.3.-101-AS-09-05-03-045	

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	13 DE AGOSTO DE 2020	N/A
TERMINACIÓN	11 DE OCTUBRE DE 2020	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

13 DE AGOSTO DE 2020

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 11 DE OCTUBRE DE 2020

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	4190-03123-9	\$187,944.14	06 DE AGOSTO DE 2020	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
CUMPLIMIENTO	4190-03126-4	\$37,588.83	06 DE AGOSTO DE 2020	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
VICIOS OCULTOS	4190-03537-6	\$36,092.95	12 DE OCTUBRE DE 2020	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-029-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-045/20 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2020 Y No. OBRA 2.2.3.-101-AS-09-05-03-045		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 339.82 M DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIAMETRO RD-26,02 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM. 3" DE DIAMETRO DE Fo.Fo., 26.00 TOMAS DOMICILIARIAS LARGA DE 7.00 A 9.00 METROS A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC Y 27.00 TOMAS DOMICILIARIA CORTA DE 0.00 A 4.00 MTS A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC ADAPTADOR DE TUBO KITEC, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA APISONADA, ACARREOS, CONSTRUCCION DE ATRAQUES, SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, CAJAS PARA OPERACION DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO Y DE TAPA PARA CAJAS DE VALVULAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	13 DE AGOSTO DE 2020	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 261,107.57	\$ 41,777.21	\$ 302,884.78	\$ 151,442.39
02-F (DOS-FINIQUITO)	12 DE SEPTIEMBRE DE 2020	11 DE OCTUBRE DE 2020	11 DE OCTUBRE DE 2020	\$ 50,038.56	\$ 8,006.17	\$ 58,044.73	\$ 36,501.75
TOTALES : \$				\$ 311,146.13	\$ 49,783.38	\$ 360,929.51	\$ 187,944.14

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE **\$14,958.77** (CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2020)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-029-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-045/20 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2020 Y No. OBRA 2.2.3.-101-AS-09-05-03-045		

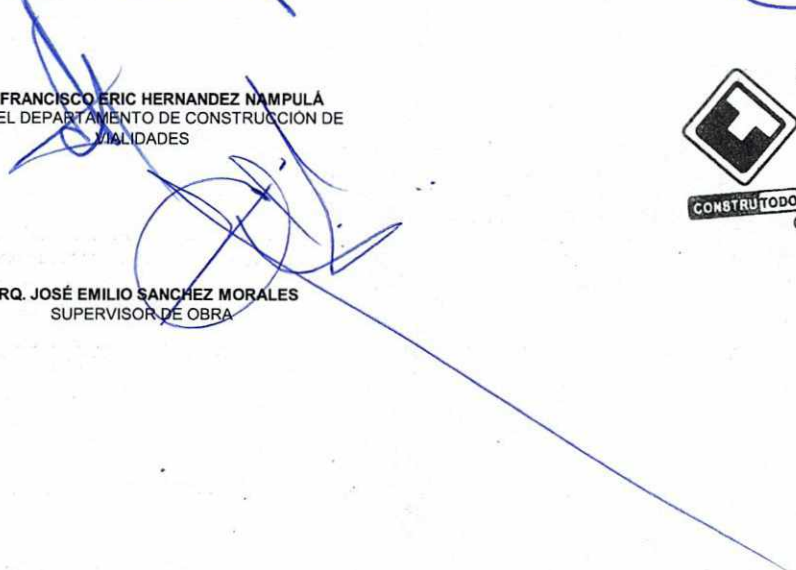
EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES


ARQ. JOSÉ EMILIO SANCHEZ MORALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V.


C. LAURELLA ALEJANDRA MARTINEZ MORALES
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS
DE AMERICA, S.A. DE C.V.
R.F.C. CMM100312JZ9
CRT TUXTLA CHICOASEN 769-A COL. PLAN DE
AYALA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
CONSTRUCTORA@CONSTRUTODO.COM.MX
