



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-061-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-084/23 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-084		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 18 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. LUIS ALBERTO ROJAS LAGUNA, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LUIS ALBERTO ROJAS LAGUNA, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN:	EN LA CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA LOS LIMONES Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	962 147 7724
DOMICILIO FISCAL:	AV. EL RECUERDO MZ 2 LT 40 FRACC. EL RECUERDO C.P. 30785, TAPACHULA, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GES091027HSA		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-061-2023	DE FECHA:	26 DE MAYO DEL 2023
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	19 DE JUNIO DEL 2023
		FECHA TERMINACION	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$1,095,325.50
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$547,662.75
		FECHA	14 DE JUNIO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-061-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-084/23 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-084		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	19 DE JUNIO DEL 2023	19 DE JUNIO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

19 DE JUNIO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 19 DE JUNIO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-24707-4	\$547,662.75	26-may-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8161-24708-7	\$109,532.55	26-may-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	8161-25895-5	\$109,532.55	18-sep-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-061-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-084/23 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-084		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 463.88 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 15 A 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 186.40 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 201.81 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 185.81 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA, GUARNICIÓN INVERTIDA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	19 DE JUNIO DE 2023	18 DE JULIO DE 2023	18 DE JULIO DE 2023	\$ 138,456.62	\$ 22,153.06	\$ 160,609.68	\$80,304.84
02 (DOS)	19 DE JULIO DE 2023	17 DE AGOSTO DE 2023	17 DE AGOSTO DE 2023	\$ 464,605.00	\$ 74,336.80	\$ 538,941.80	\$269,470.90
03-F (TRES FINIQUITO)	18 DE AGOSTO DE 2023	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 341,184.50	\$ 54,589.52	\$ 395,774.02	\$197,887.01
TOTALES : \$				\$ 944,246.12	\$ 151,079.38	\$ 1,095,325.50	\$ 547,662.75

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA


FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-061-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-084/23 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-084		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

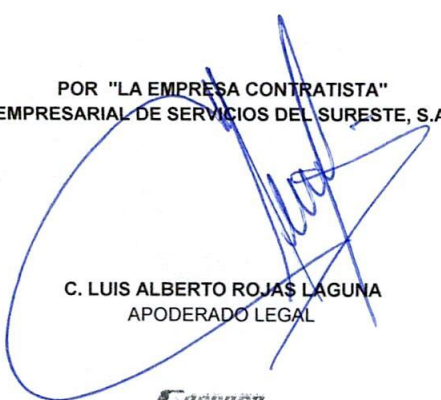
POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.


C. LUIS ALBERTO ROJAS LAGUNA
APODERADO LEGAL



GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS
DEL SURESTE S.A DE C.V.
R.F.C. GES 091027 HSA
Tapachula, Chiapas
